Terminplan Etappe 1

Projekt: C1 095, Schulanlage Schollenholz, Frauenfeld, Gesamtsanierung
Objekte: B2, TH
Bauherr: Schulen Frauenfeld, St. Gallerstrasse 25, 8501 Frauenfeld

	BKP	Bezeichnung			
	OGL	Bezeichnung			
		Unternehmer	Start	Ende	D
1		**Ausführung**	02.12.19	22.10.21	**489**
2	B2		02.12.19	22.10.21	489
3		*Baustart / Bauende*	02.12.19	22.10.21	489
4	TH		18.01.21	22.10.21	200
5		*Baustart / Bauende*	18.01.21	22.10.21	200
6		**BKP 111 Rodungen**	16.12.19	20.12.19	**5**
7	B2		16.12.19	20.12.19	5
8		*BKP 111 Rodungen*	16.12.19	20.12.19	5
9	TH				
10		**Spatenstich**	11.12.19	11.12.19	**1**
11	B2		11.12.19	11.12.19	1
12		*Spatenstich*	11.12.19	11.12.19	1
13	TH				
14		**BKP 112 Abbrüche**	13.01.20	19.03.21	**306**
15	B2		13.01.20	17.01.20	5
16		*BKP 211.1 Sportplatz*	13.01.20	17.01.20	5
17		*BKP 211.1 Stahlbetonmauern / Stufen etc.*	13.01.20	17.01.20	5
18	TH		01.02.21	19.03.21	35
19		*BKP 112.0 Demontagen E + HLKKS , Einrichtungen*	01.02.21	12.02.21	10
20		*BKP 112.1 Abbrüche Innenbereich*	08.02.21	19.03.21	30
21		*BKP 112.1 Abbrüche Fenster*	08.02.21	12.02.21	5
22		**BKP 114 Erdbewegungen**	20.01.20	24.01.20	**5**
23	B2		20.01.20	24.01.20	5
24		*Mutterboden abschieben*	20.01.20	24.01.20	5
25	TH				
26		**BKP 113 Sanierung Attisten**	15.02.21	05.03.21	**15**
27	B2				
28	TH		15.02.21	05.03.21	15
29		*BKP 113 Sanierung Attisten*	15.02.21	05.03.21	15
30		**BKP 122 Provisorien**	18.01.21	15.10.21	**195**
31	B2				
32	TH		18.01.21	15.10.21	195
33		*BKP 122 Montage : Containerprovisorium*	18.01.21	05.02.21	15
34		*BKP 122 Demontage : Containerprovisorium*	11.10.21	15.10.21	5
35		*BKP 122 Montage : Schutz von Bauteilen wie Hallenl*	01.02.21	05.02.21	5
36		*BKP 122 Demontage : Schutz von Bauteilen wie Hall*	08.08.21	13.08.21	5
37		**BKP 130 Gemeinsame Baustelleneinrichtung**	02.12.19	31.01.20	**41**
38	B2		02.12.19	31.01.20	41
39		*BKP 131 Abschrankungen*	02.12.19	13.12.19	10
40		*BKP 132 Zufahrten Plätze*	27.01.20	31.01.20	5
41		*BKP 135 Provisorische Installationen*	27.01.20	31.01.20	5
42		*BKP 138 Sortierung Bauabfälle*	27.01.20	31.01.20	5
43	TH				
44		**BKP 201 Baugrubenaushub 1**	03.02.20	21.02.20	**15**
45	B2		03.02.20	21.02.20	15
46		*Baugrubenaushub 1*	03.02.20	21.02.20	15
47	TH				
48		**BKP 211 Baumeisterarbeiten 1**	24.02.20	06.04.21	**290**
49	B2		24.02.20	06.04.21	290
50		*BKP 211.0 Baustelleneinrichtung*	24.02.20	06.03.20	10
51		*BKP 211.1 Gerüste Fassade*	12.05.20	06.04.21	234
52		*BKP 211.3 Baumeisteraushub*	02.03.20	13.03.20	10
53		*BKP 211.4 Kanalisation im Gebäude*	09.03.20	20.03.20	10
54		*BKP 211.5 Beton - u. Stahlbetonarbeiten*	16.03.20	31.07.20	100
55		*BKP 211.6 Maurerarbeiten*	06.04.20	10.07.20	70
56	TH				
57		**BKP 212 Montagebau in Beton 1**	07.04.20	18.12.20	**184**
58	B2		07.04.20	18.12.20	184
59		*Vorfabrizierte Stützen in Beton*	07.04.20	14.07.20	71
60		*Fassadenbekleidung*	26.10.20	18.12.20	40
61	TH				
62		**BKP 201 Baugrubenaushub 2**	04.05.20	22.05.20	**15**
63	B2		04.05.20	22.05.20	15
64		*Baugrubenaushub 2*	04.05.20	22.05.20	15
65	TH				
66		**BKP 211 Baumeisterarbeiten 2**	25.05.20	02.04.21	**223**
67	B2		25.05.20	02.04.21	223
68		*BKP 211.1 Gerüste Fassade*	03.08.20	02.04.21	173
69		*BKP 211.3 Baumeisteraushub*	25.05.20	05.06.20	10
70		*BKP 211.4 Kanalisation im Gebäude*	01.06.20	12.06.20	10
71		*BKP 211.5 Beton - Stahlbetonarbeiten*	08.06.20	23.10.20	100
72		*BKP 211.6 Maurerarbeiten*	29.06.20	02.10.20	70
73	TH				
74		**BKP 211 Baumeisterarbeiten**	08.02.21	09.07.21	**110**
75	B2				
76	TH		08.02.21	09.07.21	110
77		*BKP 211.1 Gerüste Fassade*	08.02.21	09.07.21	110
78		*BKP 211.3 Baumeisteraushub in Hohlräumen*	08.02.21	05.03.21	20
79		*BKP 211.5 Beton - Stahlbetonarbeiten*	15.02.21	09.04.21	40
80		*BKP 211.6 Maurerarbeiten*	29.03.21	16.04.21	15
81		*BKP 211.7 Instandsetzungsarbeiten Sichtbeton*	29.03.21	16.04.21	15
82		**BKP 212 Montagebau in Beton 2**	29.06.20	05.02.21	**158**
83	B2		29.06.20	05.02.21	158
84		*BKP 212 Vorfabrizierte Stützen in Beton*	29.06.20	02.10.20	70
85		*BKP 212 Fassadenbekleidung*	23.11.20	05.02.21	53
86	TH				
87		**BKP 213 Montgebau in Stahl**	01.03.21	02.04.21	**25**
88	B2				
89	TH		01.03.21	02.04.21	25
90		*BKP 213 Montagebau in Stahl (Erdbebenertüchtigu*	01.03.21	02.04.21	25
91		**BKP 221 Fenster, Aussentüren, Tore**	28.09.20	14.05.21	**163**
92	B2		28.09.20	20.11.20	40
93		*BKP 221.1 Fenster aus Holz / Metall Etappe 1*	28.09.20	23.10.20	20
94		*BKP 221.5 Aussentüren Holz Etappe 1*	28.09.20	23.10.20	20
95		*BKP 221.6 Aussentüren Metall Etappe 1*	28.09.20	23.10.20	20
96		*BKP 221.9 Metallbaufertigteile Etappe 1*	28.09.20	23.10.20	20
97		*BKP 221.1 Fenster aus Holz / Metall Etappe 2*	26.10.20	20.11.20	20
98		*BKP 221.5 Aussentüren Holz Etappe 2*	26.10.20	20.11.20	20
99		*BKP 221.6 Aussentüre aus Metall Etappe 2*	26.10.20	20.11.20	20
100		*BKP 221.9 Metallbaufertigteile*	26.10.20	20.11.20	20
101	TH		15.02.21	14.05.21	65
102		*Ab Abbruch Fenster : Planungs - u. Produktionszeit F*	15.02.21	23.04.21	50
103		*BKP 221.1 Fenster aus Holz / Metall : Umkleide*	26.04.21	30.04.21	5
104		*BKP 221.1 Fenster aus Holz / Metall : Turnhalle*	03.05.21	14.05.21	10
105		*BKP 221.5 Aussentüren aus Holz*	10.05.21	14.05.21	5
106		*BKP 221.6 Aussentüren aus Metall*	10.05.21	14.05.21	5
107		**BKP 222 Spenglerarbeiten**	12.10.20	23.04.21	**138**
108	B2		12.10.20	06.11.20	20
109		*BKP 222 Rückhaltesystem*	12.10.20	06.11.20	20
110	TH		05.04.21	23.04.21	15
111		*BKP 222 Rückhaltesystem / Dachränder*	05.04.21	23.04.21	15
112		**BKP 223 Blitzschutz**	12.10.20	23.04.21	**138**
113	B2		12.10.20	06.11.20	20
114		*BKP 223 Blitzschutz*	12.10.20	06.11.20	20
115	TH		05.04.21	23.04.21	15
116		*BKP 223 Blitzschutz*	05.04.21	23.04.21	15
117		**BKP 224 Bedachungsarbeiten**	03.08.20	23.04.21	**188**
118	B2		03.08.20	06.11.20	70
119		*BKP 224.1 Dichtungsbeläge Flachdächer (nur bis Da*	03.08.20	14.08.20	10
120		*BKP 224.3 Glaseinbauten in Flachdächern Etappe 1*	28.09.20	02.10.20	5
121		*BKP 224.1 Dichtungsbeläge Flachdächer Etappe 1 +*	12.10.20	06.11.20	20
122		*BKP 224.3 Glaseinbauten in Flachdächern Etappe 2*	26.10.20	30.10.20	5
123	TH		05.04.21	23.04.21	15
124		*BKP 224.1 Anpassungen / Ergänzungen Dichtungsbä*	05.04.21	23.04.21	15
125		*BKP 224.3 Glaseinbauten in Flachdächern*	05.04.21	23.04.21	15
126		**BKP 225.2 Spezielle Dämmungen**	17.05.21	11.06.21	**20**
127	B2				
128	TH		17.05.21	11.06.21	20
129		*BKP 225.2 Dämmungen im Untergeschoss*	17.05.21	11.06.21	20
130		**BKP 226 Fassadenputze**	17.05.21	11.06.21	**20**
131	B2				
132	TH		17.05.21	11.06.21	20
133		*BKP 226.1 Fassadenputze sanieren*	17.05.21	11.06.21	20
134		**BKP 228 Äussere Abschlüsse, Sonnenschutzanl**	08.02.21	05.03.21	**20**
135	B2		08.02.21	05.03.21	20
136		*BKP 228.1 Lamellenstoren*	08.02.21	05.03.21	20
137	TH				
138		**BKP 227 Äussere Oberflächenbehandlungen**	08.03.21	09.07.21	**90**
139	B2		08.03.21	02.04.21	20
140		*BKP 227.1 Hydrophobierung Sichtbetonfassade*	08.03.21	02.04.21	20
141	TH		14.06.21	09.07.21	20
142		*BKP 227.1 Äussere Malerarbeiten*	14.06.21	25.06.21	10
143		*BKP 227.1 Hydrophobierung Sichtbetonfassade*	28.06.21	09.07.21	10
144		**BKP 230 Elektroanlagen**	30.03.20	06.08.21	**353**
145	B2		30.03.20	09.07.21	333
146		*Rohrinstallation*	30.03.20	04.12.20	180
147		*Kabelzug / VT / UVT / MSR etc.*	01.02.21	18.06.21	100
148		*Endmontage*	21.06.21	09.07.21	15
149	TH		08.03.21	06.08.21	110
150		*Rohrinstallation*	08.03.21	02.04.21	20
151		*Kabelzug / VT / UVT / MSR etc.*	19.04.21	25.06.21	50
152		*Endmontage*	26.07.21	06.08.21	10
153		**BKP 240 Heizung -, Lüftung -, Klima - und Kältean**	30.03.20	06.08.21	**353**

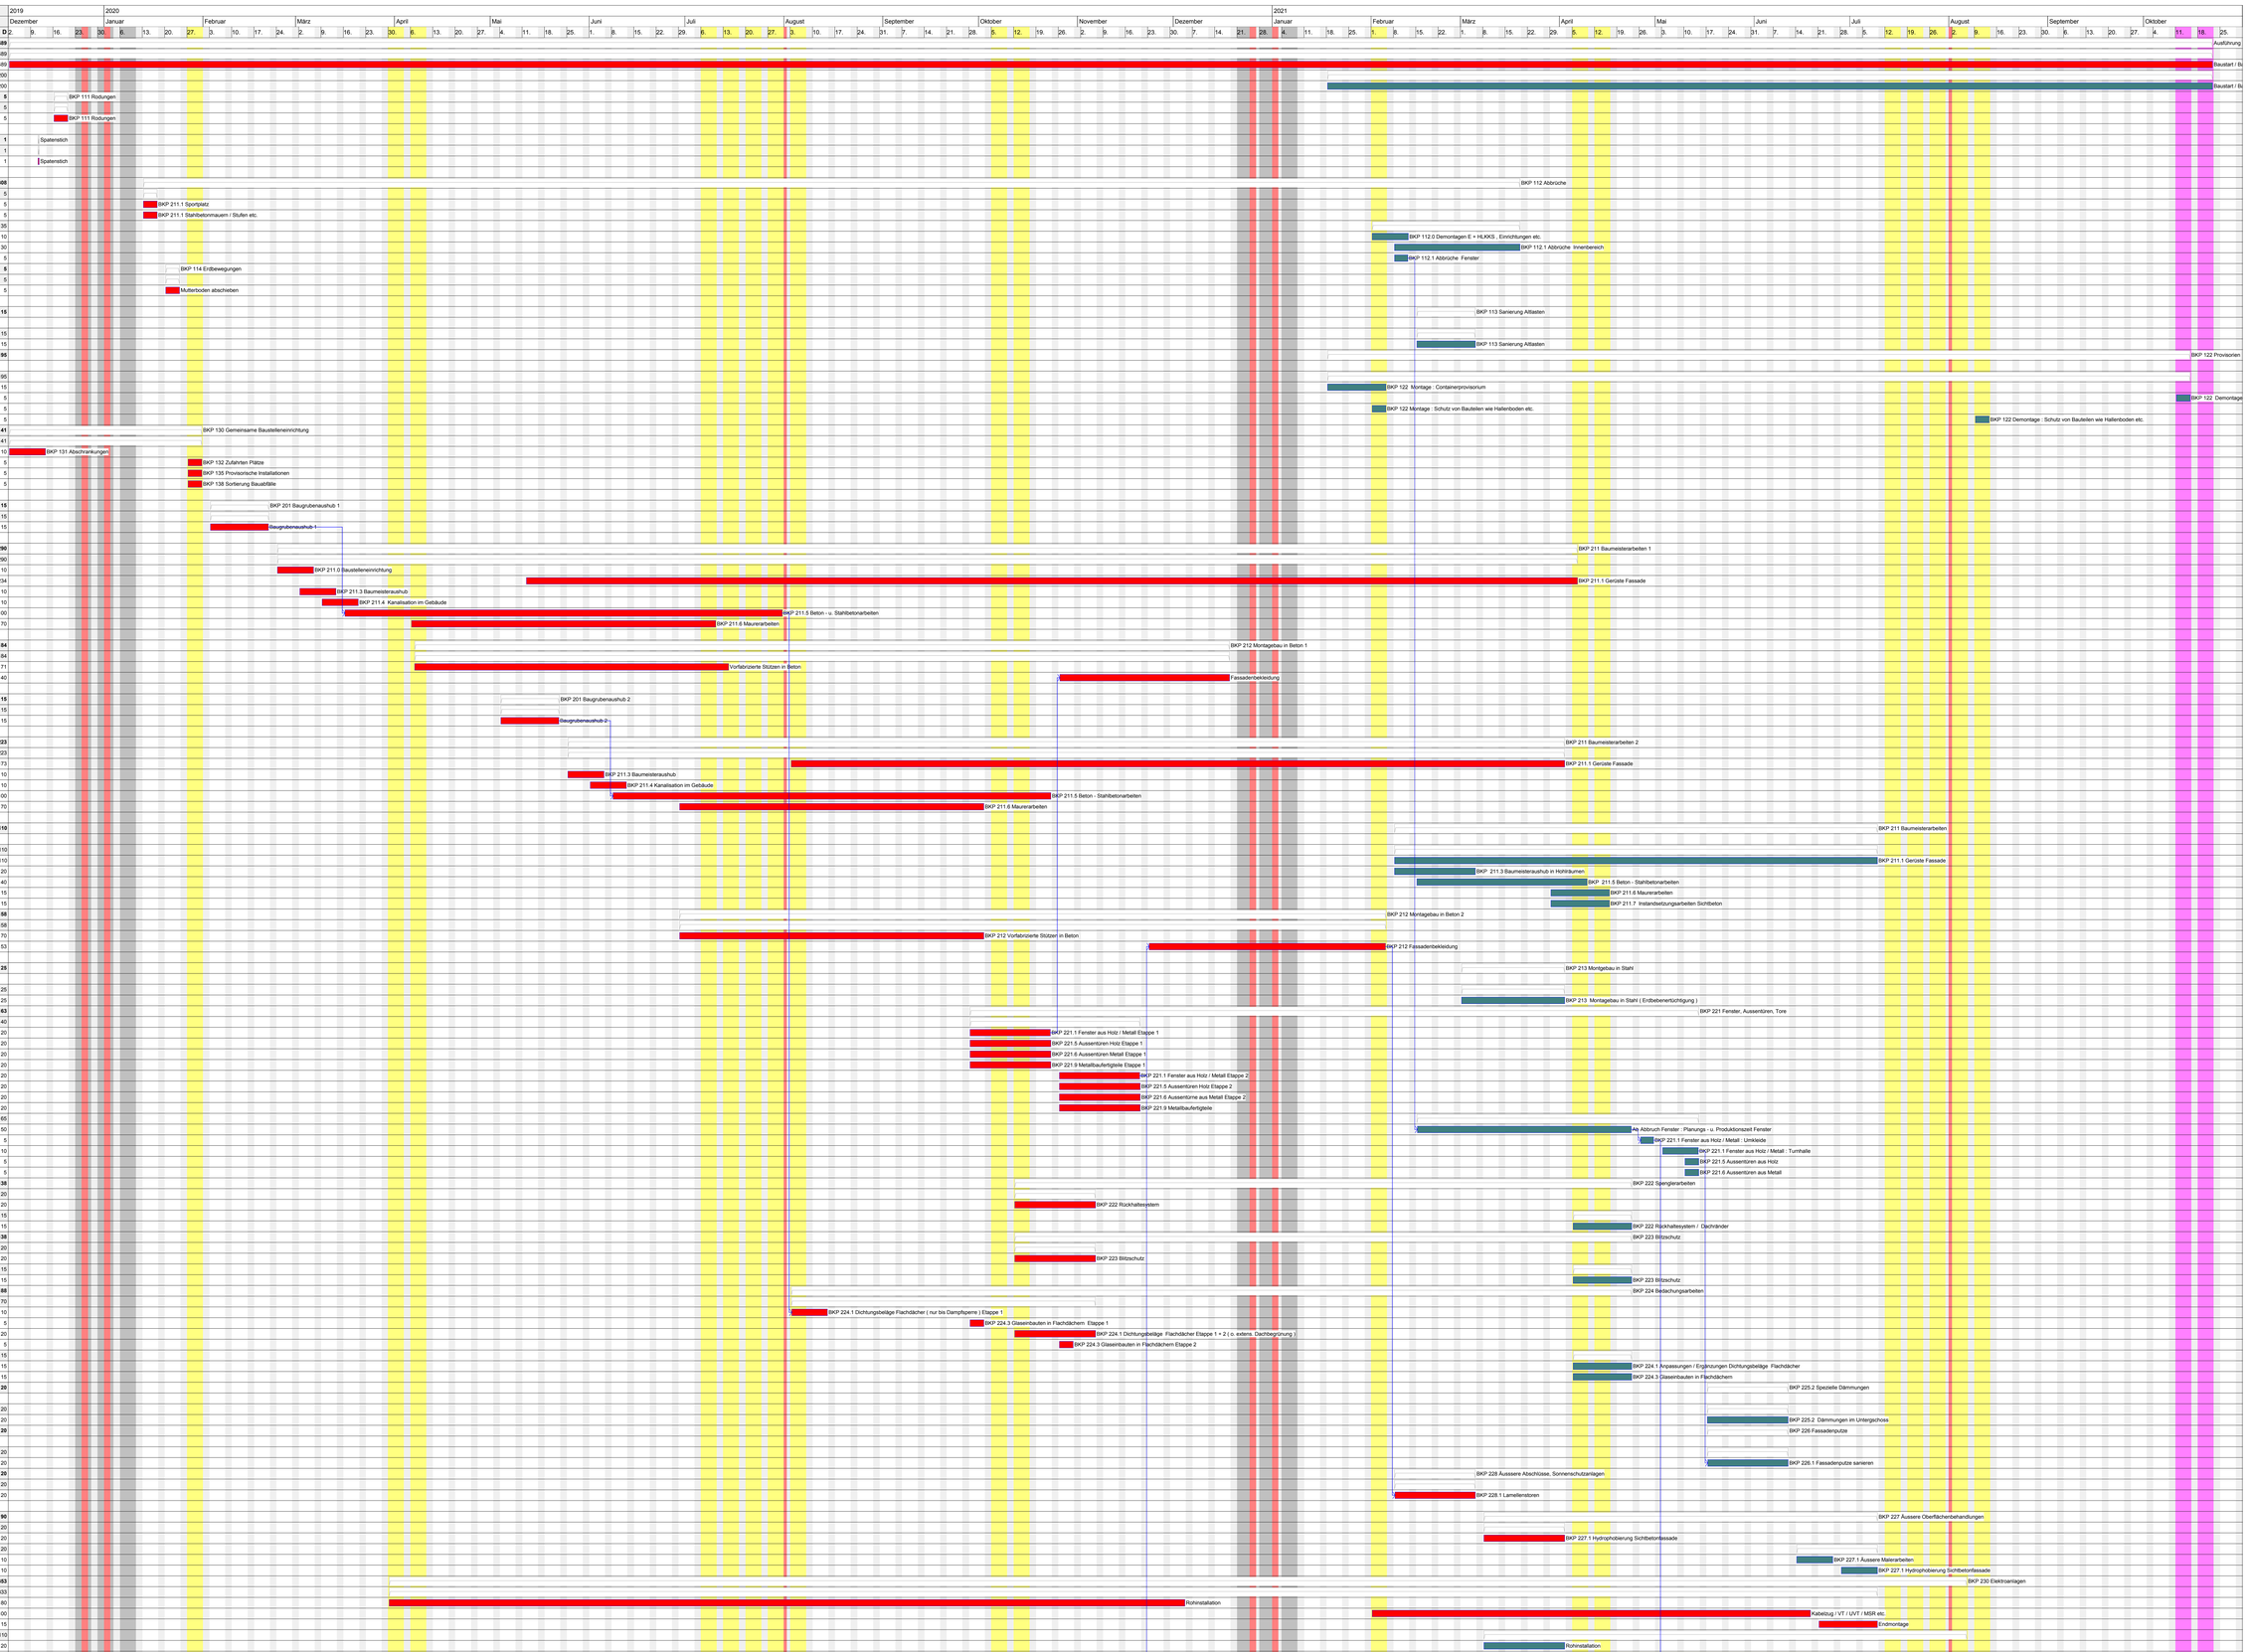
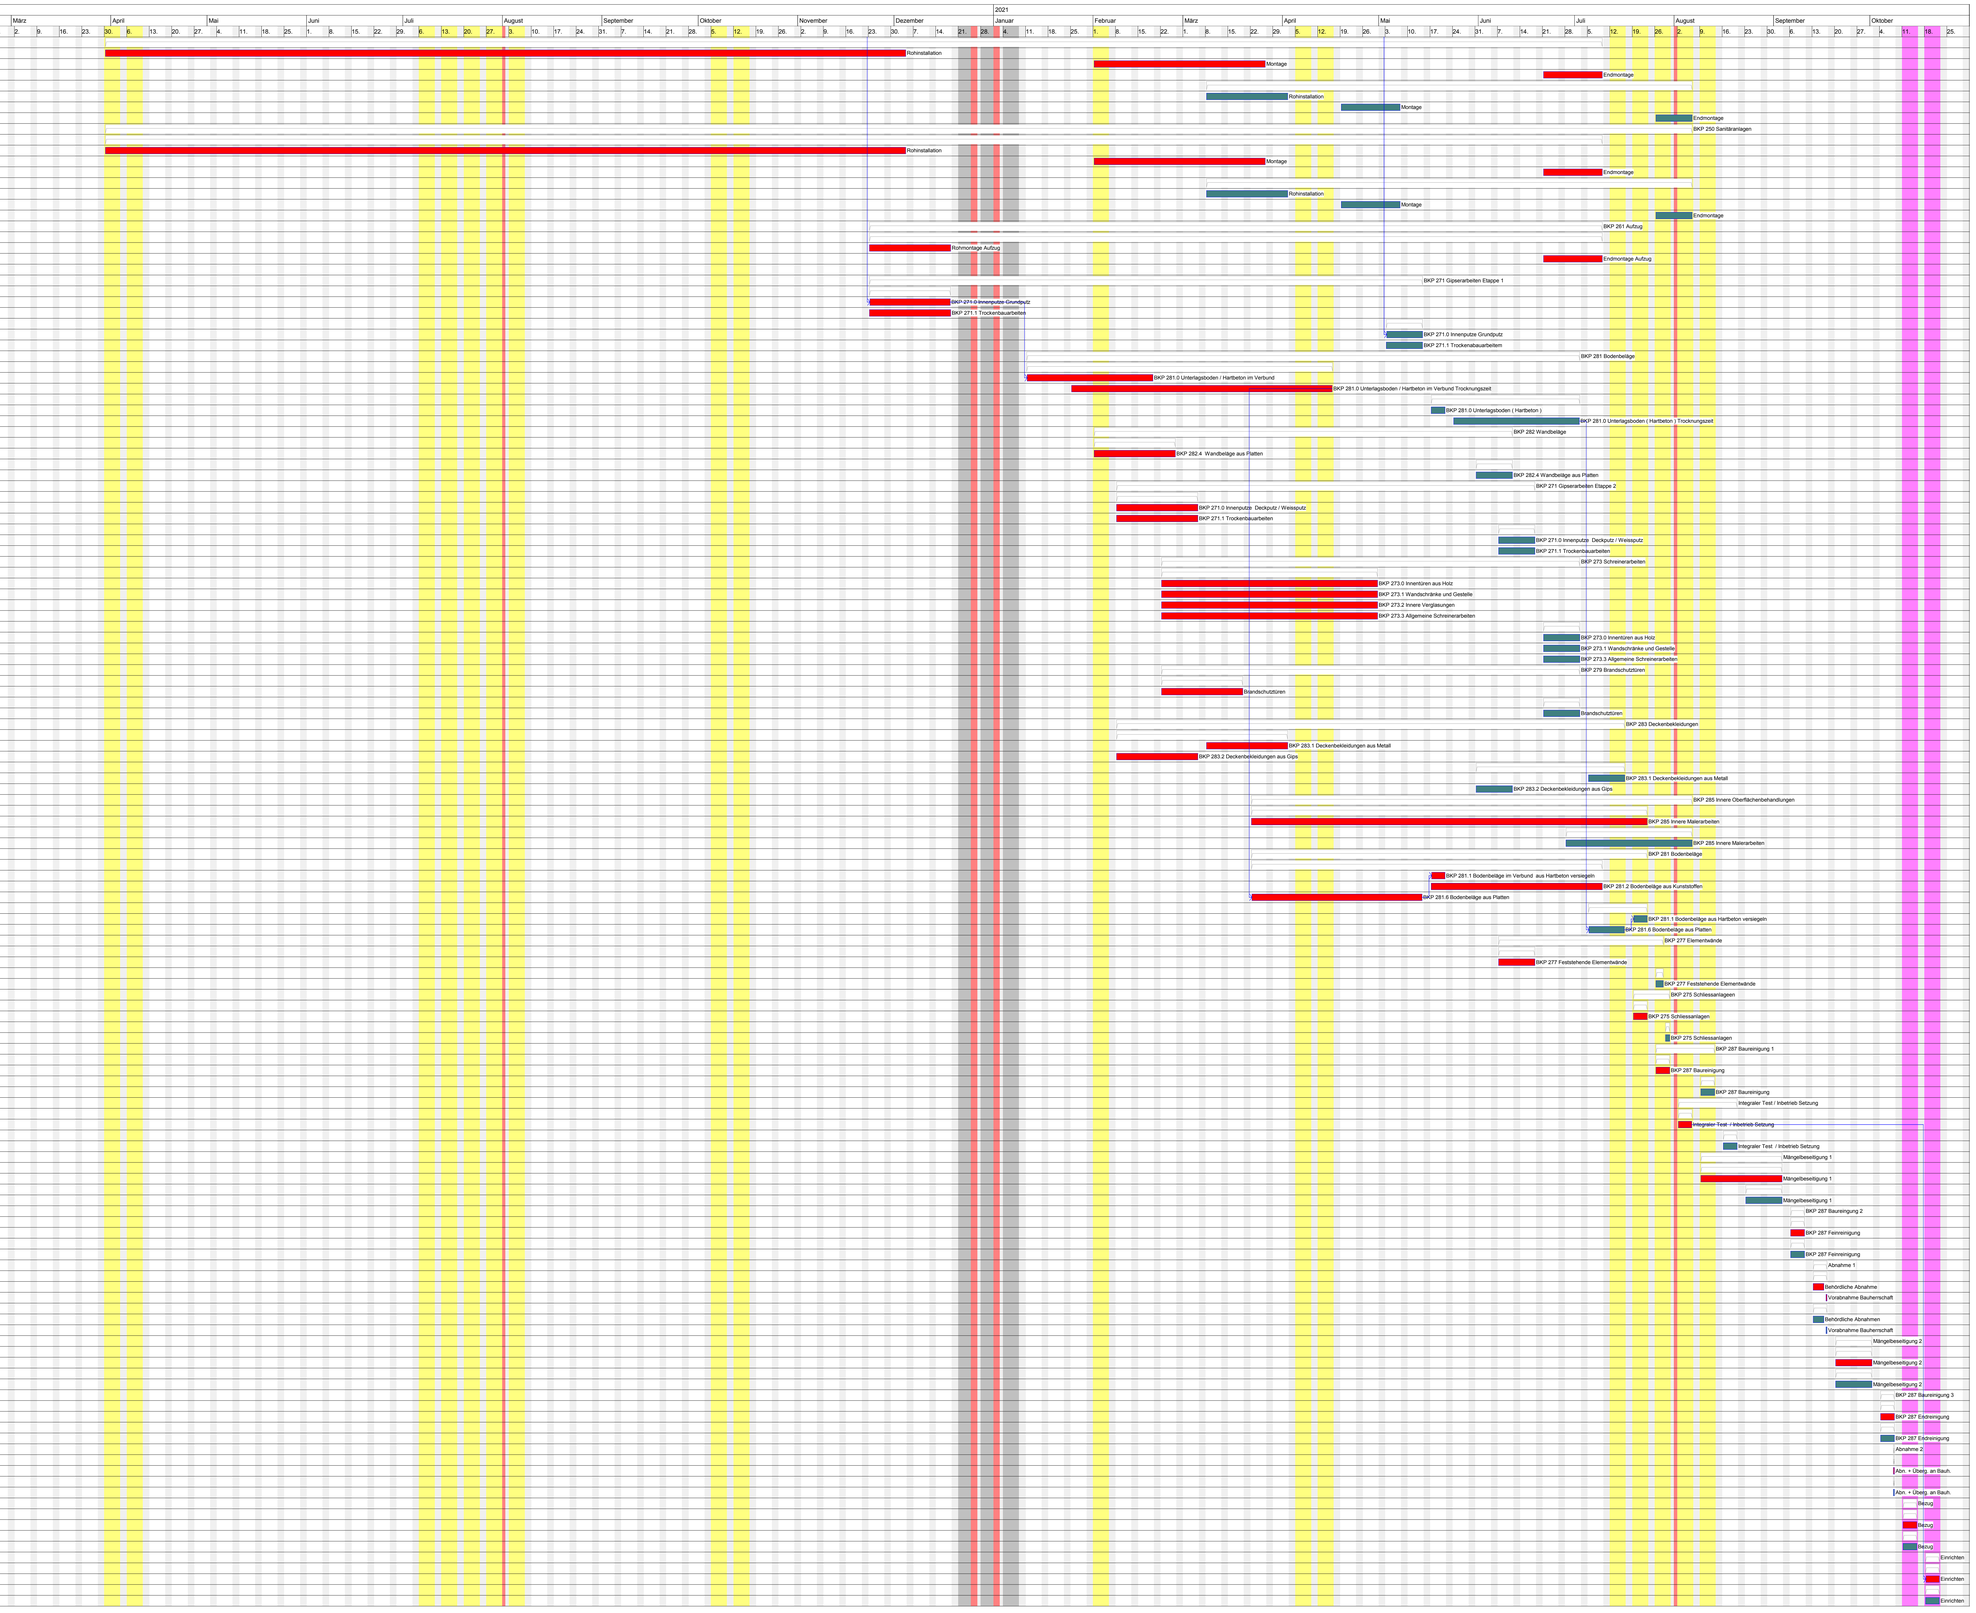
	BKP	Bezeichnung			
	OGL	Bezeichnung			
		Unternehmer	Start	Ende	D
154	B2		30.03.20	09.07.21	333
155		*Rohrinstallation*	30.03.20	04.12.20	180
156		*Montage*	01.02.21	26.03.21	40
157		*Endmontage*	21.06.21	09.07.21	15
158	TH		08.03.21	06.08.21	110
159		*Rohrinstallation*	08.03.21	02.04.21	20
160		*Montage*	19.04.21	07.05.21	15
161		*Endmontage*	26.07.21	06.08.21	10
162		**BKP 250 Sanitäranlagen**	30.03.20	06.08.21	**353**
163	B2		30.03.20	09.07.21	333
164		*Rohrinstallation*	30.03.20	04.12.20	180
165		*Montage*	01.02.21	26.03.21	40
166		*Endmontage*	21.06.21	09.07.21	15
167	TH		08.03.21	06.08.21	110
168		*Rohrinstallation*	08.03.21	02.04.21	20
169		*Montage*	19.04.21	07.05.21	15
170		*Endmontage*	26.07.21	06.08.21	10
171		**BKP 261 Aufzug**	23.11.20	09.07.21	**163**
172	B2		23.11.20	09.07.21	163
173		*Rohmontage Aufzug*	23.11.20	18.12.20	20
174		*Endmontage Aufzug*	21.06.21	09.07.21	15
175	TH				
176		**BKP 271 Gipserarbeiten Etappe 1**	23.11.20	14.05.21	**123**
177	B2		23.11.20	18.12.20	20
178		*BKP 271.0 Innenputze Grundputz*	23.11.20	18.12.20	20
179		*BKP 271.1 Trockenbauarbeiten*	23.11.20	18.12.20	20
180	TH		03.05.21	14.05.21	10
181		*BKP 271.0 Innenputze Grundputz*	03.05.21	14.05.21	10
182		*BKP 271.1 Trockenabauarbeitem*	03.05.21	14.05.21	10
183		**BKP 281 Bodenbeläge**	11.01.21	02.07.21	**125**
184	B2		11.01.21	16.04.21	70
185		*BKP 281.0 Unterlagsboden / Hartbeton im Verbund*	11.01.21	19.02.21	30
186		*BKP 281.0 Unterlagsboden / Hartbeton im Verbund T*	25.01.21	16.04.21	60
187	TH		17.05.21	02.07.21	35
188		*BKP 281.0 Unterlagsboden (Hartbeton)*	17.05.21	21.05.21	5
189		*BKP 281.0 Unterlagsboden (Hartbeton) Trocknungs*	24.05.21	02.07.21	30
190		**BKP 282 Wandbeläge**	01.02.21	11.06.21	**95**
191	B2		01.02.21	26.02.21	20
192		*BKP 282.4 Wandbeläge aus Platten*	01.02.21	26.02.21	20
193	TH		31.05.21	11.06.21	10
194		*BKP 282.4 Wandbeläge aus Platten*	31.05.21	11.06.21	10
195		**BKP 271 Gipserarbeiten Etappe 2**	08.02.21	18.06.21	**95**
196	B2		08.02.21	05.03.21	20
197		*BKP 271.0 Innenputze Deckputz / Weissputz*	08.02.21	05.03.21	20
198		*BKP 271.1 Trockenbauarbeiten*	08.02.21	05.03.21	20
199	TH		07.06.21	18.06.21	10
200		*BKP 271.0 Innenputze Deckputz / Weissputz*	07.06.21	18.06.21	10
201		*BKP 271.1 Trockenbauarbeiten*	07.06.21	18.06.21	10
202		**BKP 273 Schreinerarbeiten**	22.02.21	02.07.21	**95**
203	B2		22.02.21	30.04.21	50
204		*BKP 273.0 Innentüren aus Holz*	22.02.21	30.04.21	50
205		*BKP 273.1 Wandschränke und Gestelle*	22.02.21	30.04.21	50
206		*BKP 273.2 Innere Verglasungen*	22.02.21	30.04.21	50
207		*BKP 273.3 Allgemeine Schreinerarbeiten*	22.02.21	30.04.21	50
208	TH		21.06.21	02.07.21	10
209		*BKP 273.0 Innentüren aus Holz*	21.06.21	02.07.21	10
210		*BKP 273.1 Wandschränke und Gestelle*	21.06.21	02.07.21	10
211		*BKP 273.3 Allgemeine Schreinerarbeiten*	21.06.21	02.07.21	10
212		**BKP 279 Brandschutztüren**	22.02.21	02.07.21	**95**
213	B2		22.02.21	19.03.21	20
214		*Brandschutztüren*	22.02.21	19.03.21	20
215	TH		21.06.21	02.07.21	10
216		*Brandschutztüren*	21.06.21	02.07.21	10
217		**BKP 283 Deckenbekleidungen**	08.02.21	16.07.21	**115**
218	B2		08.02.21	02.04.21	40
219		*BKP 283.1 Deckenbekleidungen aus Metall*	08.03.21	02.04.21	20
220		*BKP 283.2 Deckenbekleidungen aus Gips*	08.02.21	05.03.21	20
221	TH		31.05.21	16.07.21	35
222		*BKP 283.1 Deckenbekleidungen aus Metall*	05.07.21	16.07.21	10
223		*BKP 283.2 Deckenbekleidungen aus Gips*	31.05.21	11.06.21	10
224		**BKP 285 Innere Oberflächenbehandlungen**	22.03.21	06.08.21	**100**
225	B2		22.03.21	23.07.21	90
226		*BKP 285 Innere Malerarbeiten*	22.03.21	23.07.21	90
227	TH		28.06.21	06.08.21	30
228		*BKP 285 Innere Malerarbeiten*	28.06.21	06.08.21	30
229		**BKP 281 Bodenbeläge**	22.03.21	23.07.21	**90**
230	B2		22.03.21	09.07.21	80
231		*BKP 281.1 Bodenbeläge im Verbund aus Hartbeton*	17.05.21	21.05.21	5
232		*BKP 281.2 Bodenbeläge aus Kunststoffen*	17.05.21	09.07.21	40
233		*BKP 281.6 Bodenbeläge aus Platten*	22.03.21	14.05.21	40
234	TH		05.07.21	23.07.21	15
235		*BKP 281.1 Bodenbeläge aus Hartbeton versiegeln*	19.07.21	23.07.21	5
236		*BKP 281.6 Bodenbeläge aus Platten*	05.07.21	16.07.21	10
237		**BKP 277 Elementwände**	07.06.21	28.07.21	**38**
238	B2		07.06.21	18.06.21	10
239		*BKP 277 Feststehende Elementwände*	07.06.21	18.06.21	10
240	TH		26.07.21	28.07.21	3
241		*BKP 277 Feststehende Elementwände*	26.07.21	28.07.21	3
242		**BKP 275 Schliessanlageen**	19.07.21	30.07.21	**10**
243	B2		19.07.21	23.07.21	5
244		*BKP 275 Schliessanlagen*	19.07.21	23.07.21	5
245	TH		29.07.21	30.07.21	2
246		*BKP 275 Schliessanlagen*	29.07.21	30.07.21	2
247		**BKP 287 Baureinigung 1**	26.07.21	13.08.21	**15**
248	B2		26.07.21	30.07.21	5
249		*BKP 287 Baureinigung*	26.07.21	30.07.21	5
250	TH		09.08.21	13.08.21	5
251		*BKP 287 Baureinigung*	09.08.21	13.08.21	5
252		**Integraler Test / Inbetrieb Setzung**	02.08.21	20.08.21	**15**
253	B2		02.08.21	06.08.21	5
254		*Integraler Test / Inbetrieb Setzung*	02.08.21	06.08.21	5
255	TH		16.08.21	20.08.21	5
256		*Integraler Test / Inbetrieb Setzung*	16.08.21	20.08.21	5
257		**Mängelbeseitigung 1**	09.08.21	03.09.21	**20**
258	B2		09.08.21	03.09.21	20
259		*Mängelbeseitigung 1*	09.08.21	03.09.21	20
260	TH		23.08.21	03.09.21	10
261		*Mängelbeseitigung 1*	23.08.21	03.09.21	10
262		**BKP 287 Baureinigung 2**	06.09.21	10.09.21	**5**
263	B2		06.09.21	10.09.21	5
264		*BKP 287 Feinreinigung*	06.09.21	10.09.21	5
265	TH		06.09.21	10.09.21	5
266		*BKP 287 Feinreinigung*	06.09.21	10.09.21	5
267		**Abnahme 1**	13.09.21	17.09.21	**5**
268	B2		13.09.21	17.09.21	5
269		*Behördliche Abnahme*	13.09.21	16.09.21	4
270		*Vorabnahme Bauherrschaft*	17.09.21	17.09.21	1
271	TH		13.09.21	17.09.21	5
272		*Behördliche Abnahmen*	13.09.21	16.09.21	4
273		*Vorabnahme Bauherrschaft*	17.09.21	17.09.21	1
274		**Mängelbeseitigung 2**	20.09.21	01.10.21	**10**
275	B2		20.09.21	01.10.21	10
276		*Mängelbeseitigung 2*	20.09.21	01.10.21	10
277	TH		20.09.21	01.10.21	10
278		*Mängelbeseitigung 2*	20.09.21	01.10.21	10
279		**BKP 287 Baureinigung 3**	04.10.21	08.10.21	**5**
280	B2		04.10.21	08.10.21	5
281		*BKP 287 Endreinigung*	04.10.21	08.10.21	5
282	TH		04.10.21	08.10.21	5
283		*BKP 287 Endreinigung*	04.10.21	08.10.21	5
284		**Abnahme 2**	08.10.21	08.10.21	**1**
285	B2		08.10.21	08.10.21	1
286		*Abn. + Überg. an Bauh.*	08.10.21	08.10.21	1
287	TH		08.10.21	08.10.21	1
288		*Abn. + Überg. an Bauh.*	08.10.21	08.10.21	1
289		**Bezug**	11.10.21	15.10.21	**5**
290	B2		11.10.21	15.10.21	5
291		*Bezug*	11.10.21	15.10.21	5
292	TH		11.10.21	15.10.21	5
293		*Bezug*	11.10.21	15.10.21	5
294		**Einrichten**	18.10.21	22.10.21	**5**
295	B2		18.10.21	22.10.21	5
296		*Einrichten*	18.10.21	22.10.21	5
297	TH		18.10.21	22.10.21	5
298		*Einrichten*	18.10.21	22.10.21	5
