# Terminplan Etappe 1

Projekt: C1 095, Schulanlage Schollenholz, Frauenfeld, Gesamtsanierung
Objekte: B2, TH
Bauherr: Schulen Frauenfeld, St. Gallerstrasse 25, 8501 Frauenfeld

| | BKP | Bezeichnung | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | OGL | Bezeichnung | | | |
| | | Unternehmer | Start | Ende | D |
| 1 | | **Ausführung** | 02.12.19 | 22.10.21 | **489** |
| 2 | B2 | | 02.12.19 | 22.10.21 | 489 |
| 3 | | *Baustart / Bauende* | 02.12.19 | 22.10.21 | 489 |
| 4 | TH | | 18.01.21 | 22.10.21 | 200 |
| 5 | | *Baustart / Bauende* | 18.01.21 | 22.10.21 | 200 |
| 6 | | **BKP 111 Rodungen** | 16.12.19 | 20.12.19 | **5** |
| 7 | B2 | | 16.12.19 | 20.12.19 | 5 |
| 8 | | *BKP 111 Rodungen* | 16.12.19 | 20.12.19 | 5 |
| 9 | TH | | | | |
| 10 | | **Spatenstich** | 11.12.19 | 11.12.19 | **1** |
| 11 | B2 | | 11.12.19 | 11.12.19 | 1 |
| 12 | | *Spatenstich* | 11.12.19 | 11.12.19 | 1 |
| 13 | TH | | | | |
| 14 | | **BKP 112 Abbrüche** | 13.01.20 | 19.03.21 | **306** |
| 15 | B2 | | 13.01.20 | 17.01.20 | 5 |
| 16 | | *BKP 211.1 Sportplatz* | 13.01.20 | 17.01.20 | 5 |
| 17 | | *BKP 211.1 Stahlbetonmauern / Stufen etc.* | 13.01.20 | 17.01.20 | 5 |
| 18 | TH | | 01.02.21 | 19.03.21 | 35 |
| 19 | | *BKP 112.0 Demontagen E + HLKKS , Einrichtungen* | 01.02.21 | 12.02.21 | 10 |
| 20 | | *BKP 112.1 Abbrüche Innenbereich* | 08.02.21 | 19.03.21 | 30 |
| 21 | | *BKP 112.1 Abbrüche Fenster* | 08.02.21 | 12.02.21 | 5 |
| 22 | | **BKP 114 Erdbewegungen** | 20.01.20 | 24.01.20 | **5** |
| 23 | B2 | | 20.01.20 | 24.01.20 | 5 |
| 24 | | *Mutterboden abschieben* | 20.01.20 | 24.01.20 | 5 |
| 25 | TH | | | | |
| 26 | | **BKP 113 Sanierung Attisten** | 15.02.21 | 05.03.21 | **15** |
| 27 | B2 | | | | |
| 28 | TH | | 15.02.21 | 05.03.21 | 15 |
| 29 | | *BKP 113 Sanierung Attisten* | 15.02.21 | 05.03.21 | 15 |
| 30 | | **BKP 122 Provisorien** | 18.01.21 | 15.10.21 | **195** |
| 31 | B2 | | | | |
| 32 | TH | | 18.01.21 | 15.10.21 | 195 |
| 33 | | *BKP 122 Montage : Containerprovisorium* | 18.01.21 | 05.02.21 | 15 |
| 34 | | *BKP 122 Demontage : Containerprovisorium* | 11.10.21 | 15.10.21 | 5 |
| 35 | | *BKP 122 Montage : Schutz von Bauteilen wie Hallenl* | 01.02.21 | 05.02.21 | 5 |
| 36 | | *BKP 122 Demontage : Schutz von Bauteilen wie Hall* | 08.08.21 | 13.08.21 | 5 |
| 37 | | **BKP 130 Gemeinsame Baustelleneinrichtung** | 02.12.19 | 31.01.20 | **41** |
| 38 | B2 | | 02.12.19 | 31.01.20 | 41 |
| 39 | | *BKP 131 Abschrankungen* | 02.12.19 | 13.12.19 | 10 |
| 40 | | *BKP 132 Zufahrten Plätze* | 27.01.20 | 31.01.20 | 5 |
| 41 | | *BKP 135 Provisorische Installationen* | 27.01.20 | 31.01.20 | 5 |
| 42 | | *BKP 138 Sortierung Bauabfälle* | 27.01.20 | 31.01.20 | 5 |
| 43 | TH | | | | |
| 44 | | **BKP 201 Baugrubenaushub 1** | 03.02.20 | 21.02.20 | **15** |
| 45 | B2 | | 03.02.20 | 21.02.20 | 15 |
| 46 | | *Baugrubenaushub 1* | 03.02.20 | 21.02.20 | 15 |
| 47 | TH | | | | |
| 48 | | **BKP 211 Baumeisterarbeiten 1** | 24.02.20 | 06.04.21 | **290** |
| 49 | B2 | | 24.02.20 | 06.04.21 | 290 |
| 50 | | *BKP 211.0 Baustelleneinrichtung* | 24.02.20 | 06.03.20 | 10 |
| 51 | | *BKP 211.1 Gerüste Fassade* | 12.05.20 | 06.04.21 | 234 |
| 52 | | *BKP 211.3 Baumeisteraushub* | 02.03.20 | 13.03.20 | 10 |
| 53 | | *BKP 211.4 Kanalisation im Gebäude* | 09.03.20 | 20.03.20 | 10 |
| 54 | | *BKP 211.5 Beton - u. Stahlbetonarbeiten* | 16.03.20 | 31.07.20 | 100 |
| 55 | | *BKP 211.6 Maurerarbeiten* | 06.04.20 | 10.07.20 | 70 |
| 56 | TH | | | | |
| 57 | | **BKP 212 Montagebau in Beton 1** | 07.04.20 | 18.12.20 | **184** |
| 58 | B2 | | 07.04.20 | 18.12.20 | 184 |
| 59 | | *Vorfabrizierte Stützen in Beton* | 07.04.20 | 14.07.20 | 71 |
| 60 | | *Fassadenbekleidung* | 26.10.20 | 18.12.20 | 40 |
| 61 | TH | | | | |
| 62 | | **BKP 201 Baugrubenaushub 2** | 04.05.20 | 22.05.20 | **15** |
| 63 | B2 | | 04.05.20 | 22.05.20 | 15 |
| 64 | | *Baugrubenaushub 2* | 04.05.20 | 22.05.20 | 15 |
| 65 | TH | | | | |
| 66 | | **BKP 211 Baumeisterarbeiten 2** | 25.05.20 | 02.04.21 | **223** |
| 67 | B2 | | 25.05.20 | 02.04.21 | 223 |
| 68 | | *BKP 211.1 Gerüste Fassade* | 03.08.20 | 02.04.21 | 173 |
| 69 | | *BKP 211.3 Baumeisteraushub* | 25.05.20 | 05.06.20 | 10 |
| 70 | | *BKP 211.4 Kanalisation im Gebäude* | 01.06.20 | 12.06.20 | 10 |
| 71 | | *BKP 211.5 Beton - Stahlbetonarbeiten* | 08.06.20 | 23.10.20 | 100 |
| 72 | | *BKP 211.6 Maurerarbeiten* | 29.06.20 | 02.10.20 | 70 |
| 73 | TH | | | | |
| 74 | | **BKP 211 Baumeisterarbeiten** | 08.02.21 | 09.07.21 | **110** |
| 75 | B2 | | | | |
| 76 | TH | | 08.02.21 | 09.07.21 | 110 |
| 77 | | *BKP 211.1 Gerüste Fassade* | 08.02.21 | 09.07.21 | 110 |
| 78 | | *BKP 211.3 Baumeisteraushub in Hohlräumen* | 08.02.21 | 05.03.21 | 20 |
| 79 | | *BKP 211.5 Beton - Stahlbetonarbeiten* | 15.02.21 | 09.04.21 | 40 |
| 80 | | *BKP 211.6 Maurerarbeiten* | 29.03.21 | 16.04.21 | 15 |
| 81 | | *BKP 211.7 Instandsetzungsarbeiten Sichtbeton* | 29.03.21 | 16.04.21 | 15 |
| 82 | | **BKP 212 Montagebau in Beton 2** | 29.06.20 | 05.02.21 | **158** |
| 83 | B2 | | 29.06.20 | 05.02.21 | 158 |
| 84 | | *BKP 212 Vorfabrizierte Stützen in Beton* | 29.06.20 | 02.10.20 | 70 |
| 85 | | *BKP 212 Fassadenbekleidung* | 23.11.20 | 05.02.21 | 53 |
| 86 | TH | | | | |
| 87 | | **BKP 213 Montgebau in Stahl** | 01.03.21 | 02.04.21 | **25** |
| 88 | B2 | | | | |
| 89 | TH | | 01.03.21 | 02.04.21 | 25 |
| 90 | | *BKP 213 Montagebau in Stahl ( Erdbebenertüchtigu* | 01.03.21 | 02.04.21 | 25 |
| 91 | | **BKP 221 Fenster, Aussentüren, Tore** | 28.09.20 | 14.05.21 | **163** |
| 92 | B2 | | 28.09.20 | 20.11.20 | 40 |
| 93 | | *BKP 221.1 Fenster aus Holz / Metall Etappe 1* | 28.09.20 | 23.10.20 | 20 |
| 94 | | *BKP 221.5 Aussentüren Holz Etappe 1* | 28.09.20 | 23.10.20 | 20 |
| 95 | | *BKP 221.6 Aussentüren Metall Etappe 1* | 28.09.20 | 23.10.20 | 20 |
| 96 | | *BKP 221.9 Metallbaufertigteile Etappe 1* | 28.09.20 | 23.10.20 | 20 |
| 97 | | *BKP 221.1 Fenster aus Holz / Metall Etappe 2* | 26.10.20 | 20.11.20 | 20 |
| 98 | | *BKP 221.5 Aussentüren Holz Etappe 2* | 26.10.20 | 20.11.20 | 20 |
| 99 | | *BKP 221.6 Aussentüre aus Metall Etappe 2* | 26.10.20 | 20.11.20 | 20 |
| 100 | | *BKP 221.9 Metallbaufertigteile* | 26.10.20 | 20.11.20 | 20 |
| 101 | TH | | 15.02.21 | 14.05.21 | 65 |
| 102 | | *Ab Abbruch Fenster : Planungs - u. Produktionszeit F* | 15.02.21 | 23.04.21 | 50 |
| 103 | | *BKP 221.1 Fenster aus Holz / Metall : Umkleide* | 26.04.21 | 30.04.21 | 5 |
| 104 | | *BKP 221.1 Fenster aus Holz / Metall : Turnhalle* | 03.05.21 | 14.05.21 | 10 |
| 105 | | *BKP 221.5 Aussentüren aus Holz* | 10.05.21 | 14.05.21 | 5 |
| 106 | | *BKP 221.6 Aussentüren aus Metall* | 10.05.21 | 14.05.21 | 5 |
| 107 | | **BKP 222 Spenglerarbeiten** | 12.10.20 | 23.04.21 | **138** |
| 108 | B2 | | 12.10.20 | 06.11.20 | 20 |
| 109 | | *BKP 222 Rückhaltesystem* | 12.10.20 | 06.11.20 | 20 |
| 110 | TH | | 05.04.21 | 23.04.21 | 15 |
| 111 | | *BKP 222 Rückhaltesystem / Dachränder* | 05.04.21 | 23.04.21 | 15 |
| 112 | | **BKP 223 Blitzschutz** | 12.10.20 | 23.04.21 | **138** |
| 113 | B2 | | 12.10.20 | 06.11.20 | 20 |
| 114 | | *BKP 223 Blitzschutz* | 12.10.20 | 06.11.20 | 20 |
| 115 | TH | | 05.04.21 | 23.04.21 | 15 |
| 116 | | *BKP 223 Blitzschutz* | 05.04.21 | 23.04.21 | 15 |
| 117 | | **BKP 224 Bedachungsarbeiten** | 03.08.20 | 23.04.21 | **188** |
| 118 | B2 | | 03.08.20 | 06.11.20 | 70 |
| 119 | | *BKP 224.1 Dichtungsbeläge Flachdächer ( nur bis Da* | 03.08.20 | 14.08.20 | 10 |
| 120 | | *BKP 224.3 Glaseinbauten in Flachdächern Etappe 1* | 28.09.20 | 02.10.20 | 5 |
| 121 | | *BKP 224.1 Dichtungsbeläge Flachdächer Etappe 1 +* | 12.10.20 | 06.11.20 | 20 |
| 122 | | *BKP 224.3 Glaseinbauten in Flachdächern Etappe 2* | 26.10.20 | 30.10.20 | 5 |
| 123 | TH | | 05.04.21 | 23.04.21 | 15 |
| 124 | | *BKP 224.1 Anpassungen / Ergänzungen Dichtungsbä* | 05.04.21 | 23.04.21 | 15 |
| 125 | | *BKP 224.3 Glaseinbauten in Flachdächern* | 05.04.21 | 23.04.21 | 15 |
| 126 | | **BKP 225.2 Spezielle Dämmungen** | 17.05.21 | 11.06.21 | **20** |
| 127 | B2 | | | | |
| 128 | TH | | 17.05.21 | 11.06.21 | 20 |
| 129 | | *BKP 225.2 Dämmungen im Untergeschoss* | 17.05.21 | 11.06.21 | 20 |
| 130 | | **BKP 226 Fassadenputze** | 17.05.21 | 11.06.21 | **20** |
| 131 | B2 | | | | |
| 132 | TH | | 17.05.21 | 11.06.21 | 20 |
| 133 | | *BKP 226.1 Fassadenputze sanieren* | 17.05.21 | 11.06.21 | 20 |
| 134 | | **BKP 228 Äussere Abschlüsse, Sonnenschutzanl** | 08.02.21 | 05.03.21 | **20** |
| 135 | B2 | | 08.02.21 | 05.03.21 | 20 |
| 136 | | *BKP 228.1 Lamellenstoren* | 08.02.21 | 05.03.21 | 20 |
| 137 | TH | | | | |
| 138 | | **BKP 227 Äussere Oberflächenbehandlungen** | 08.03.21 | 09.07.21 | **90** |
| 139 | B2 | | 08.03.21 | 02.04.21 | 20 |
| 140 | | *BKP 227.1 Hydrophobierung Sichtbetonfassade* | 08.03.21 | 02.04.21 | 20 |
| 141 | TH | | 14.06.21 | 09.07.21 | 20 |
| 142 | | *BKP 227.1 Äussere Malerarbeiten* | 14.06.21 | 25.06.21 | 10 |
| 143 | | *BKP 227.1 Hydrophobierung Sichtbetonfassade* | 28.06.21 | 09.07.21 | 10 |
| 144 | | **BKP 230 Elektroanlagen** | 30.03.20 | 06.08.21 | **353** |
| 145 | B2 | | 30.03.20 | 09.07.21 | 333 |
| 146 | | *Rohrinstallation* | 30.03.20 | 04.12.20 | 180 |
| 147 | | *Kabelzug / VT / UVT / MSR etc.* | 01.02.21 | 18.06.21 | 100 |
| 148 | | *Endmontage* | 21.06.21 | 09.07.21 | 15 |
| 149 | TH | | 08.03.21 | 06.08.21 | 110 |
| 150 | | *Rohrinstallation* | 08.03.21 | 02.04.21 | 20 |
| 151 | | *Kabelzug / VT / UVT / MSR etc.* | 19.04.21 | 25.06.21 | 50 |
| 152 | | *Endmontage* | 26.07.21 | 06.08.21 | 10 |
| 153 | | **BKP 240 Heizung -, Lüftung -, Klima - und Kältean** | 30.03.20 | 06.08.21 | **353** |

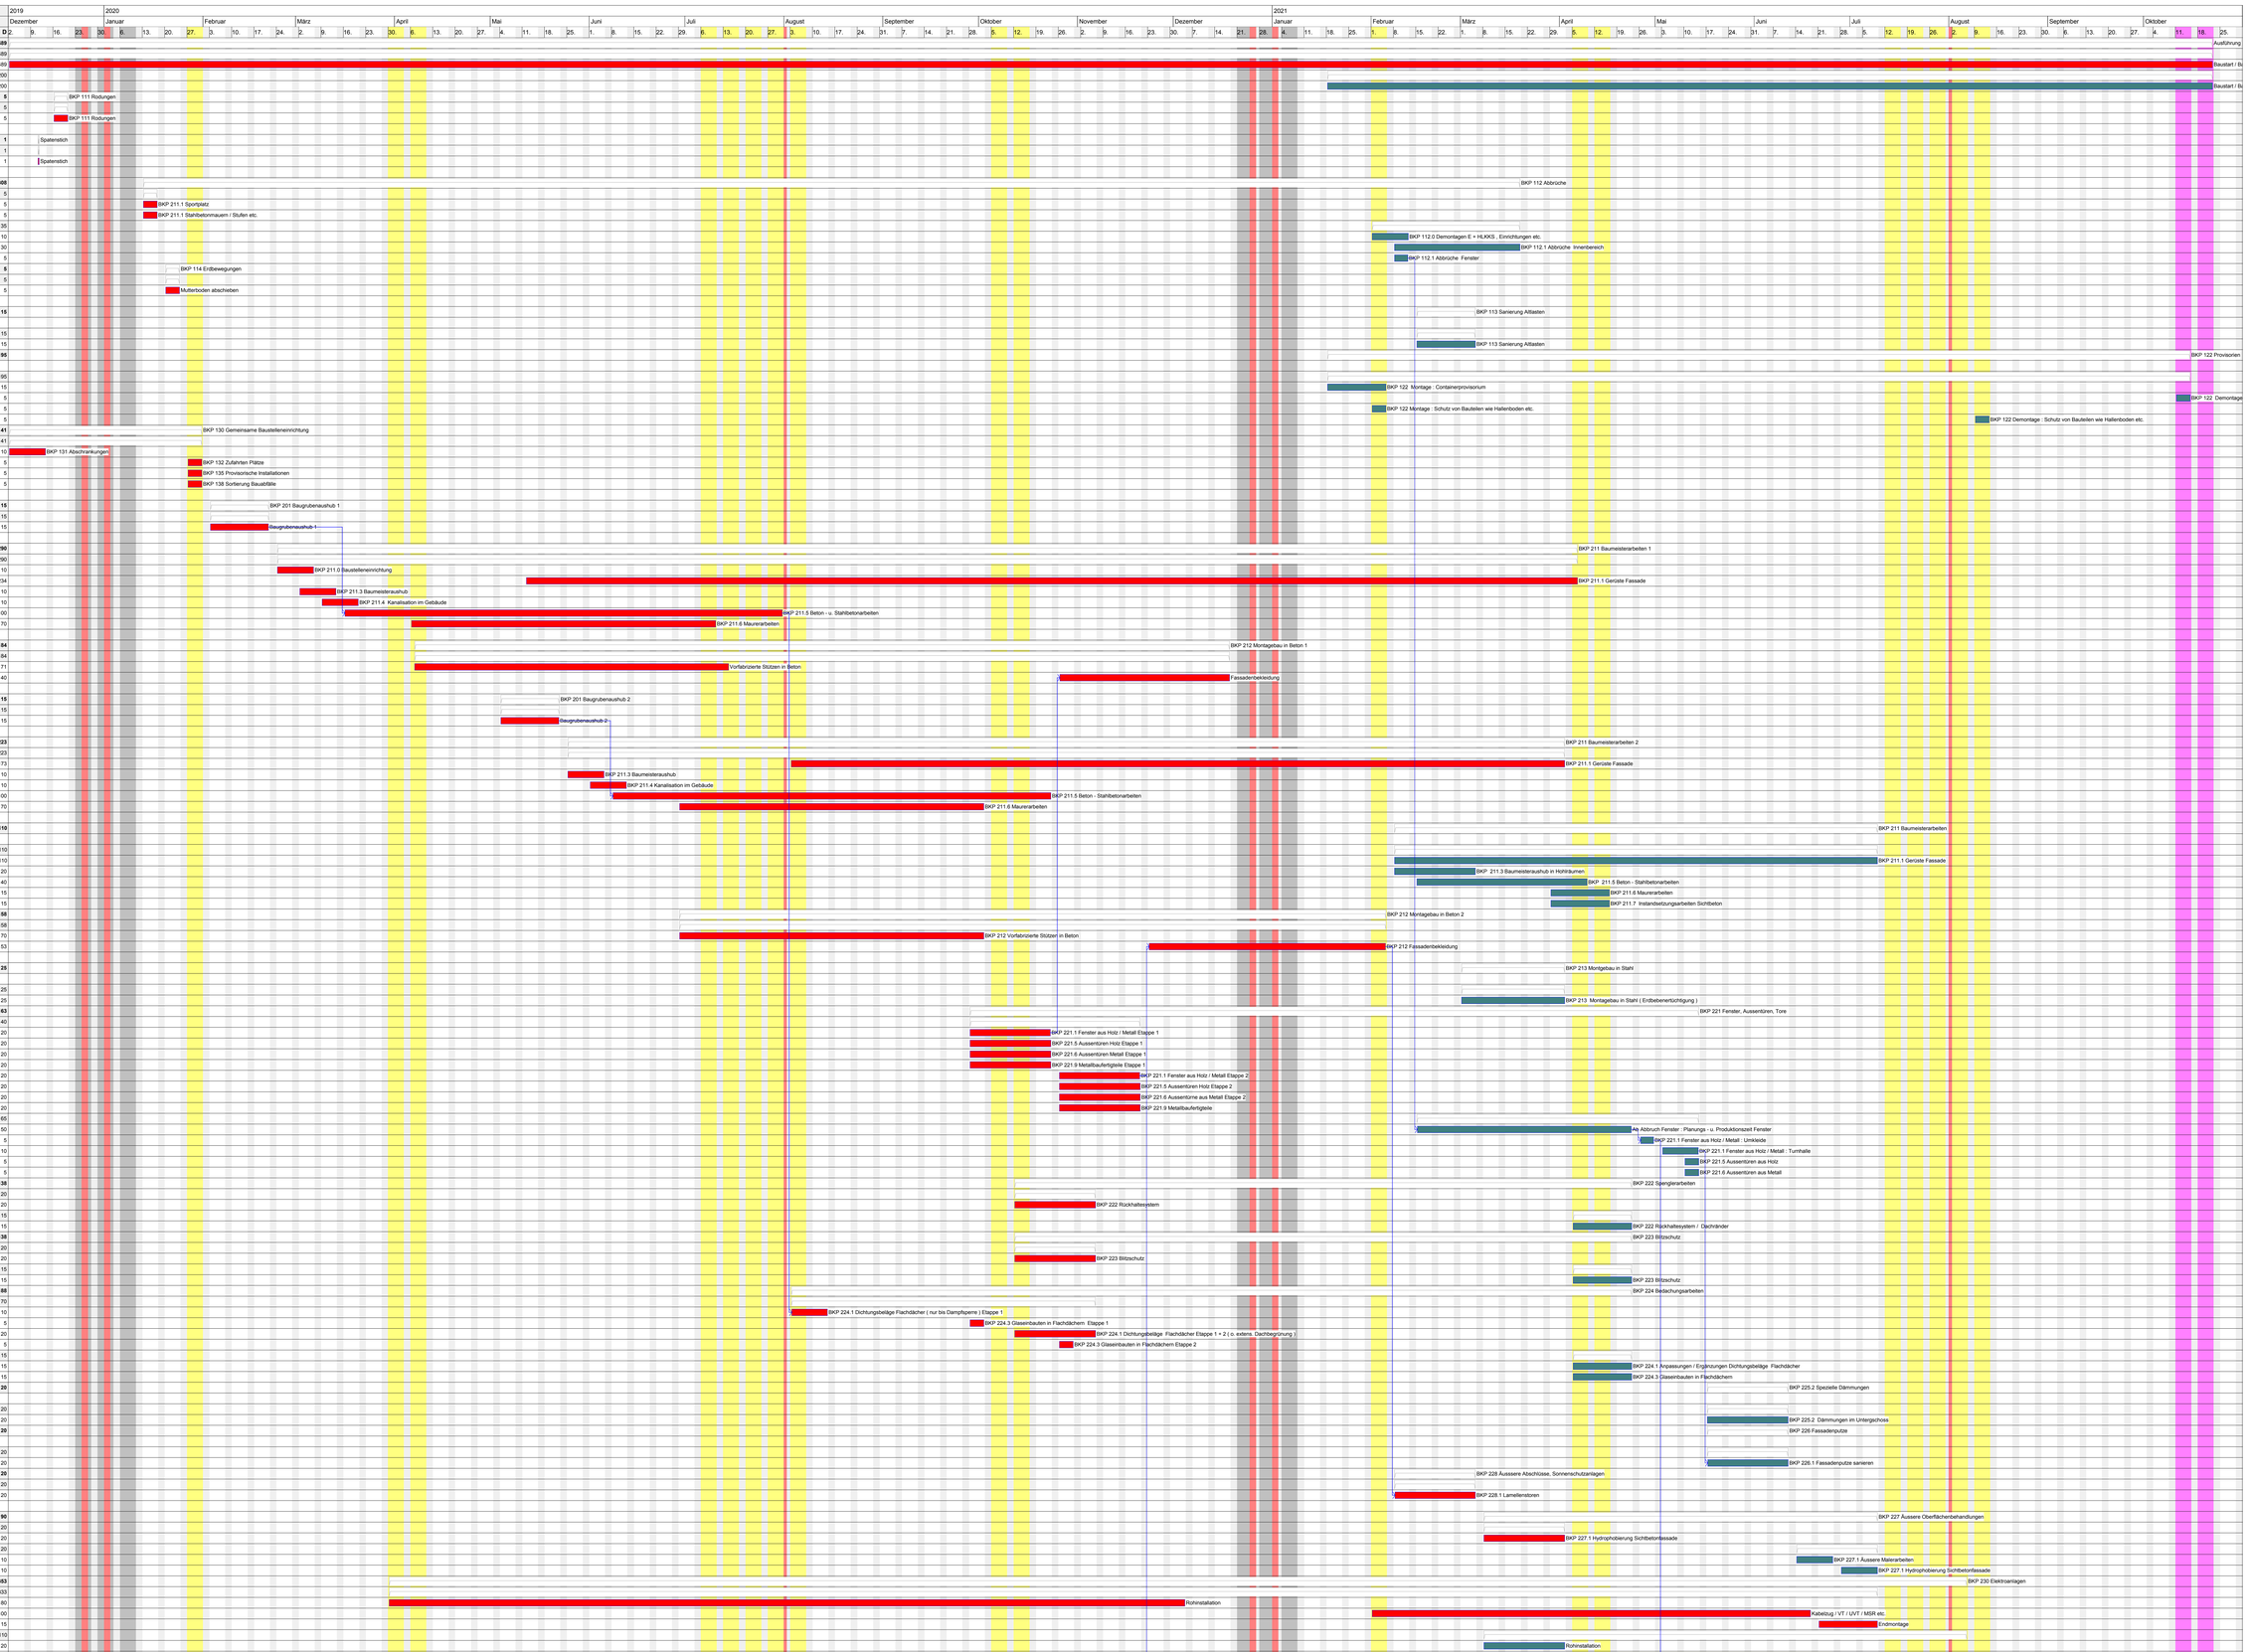
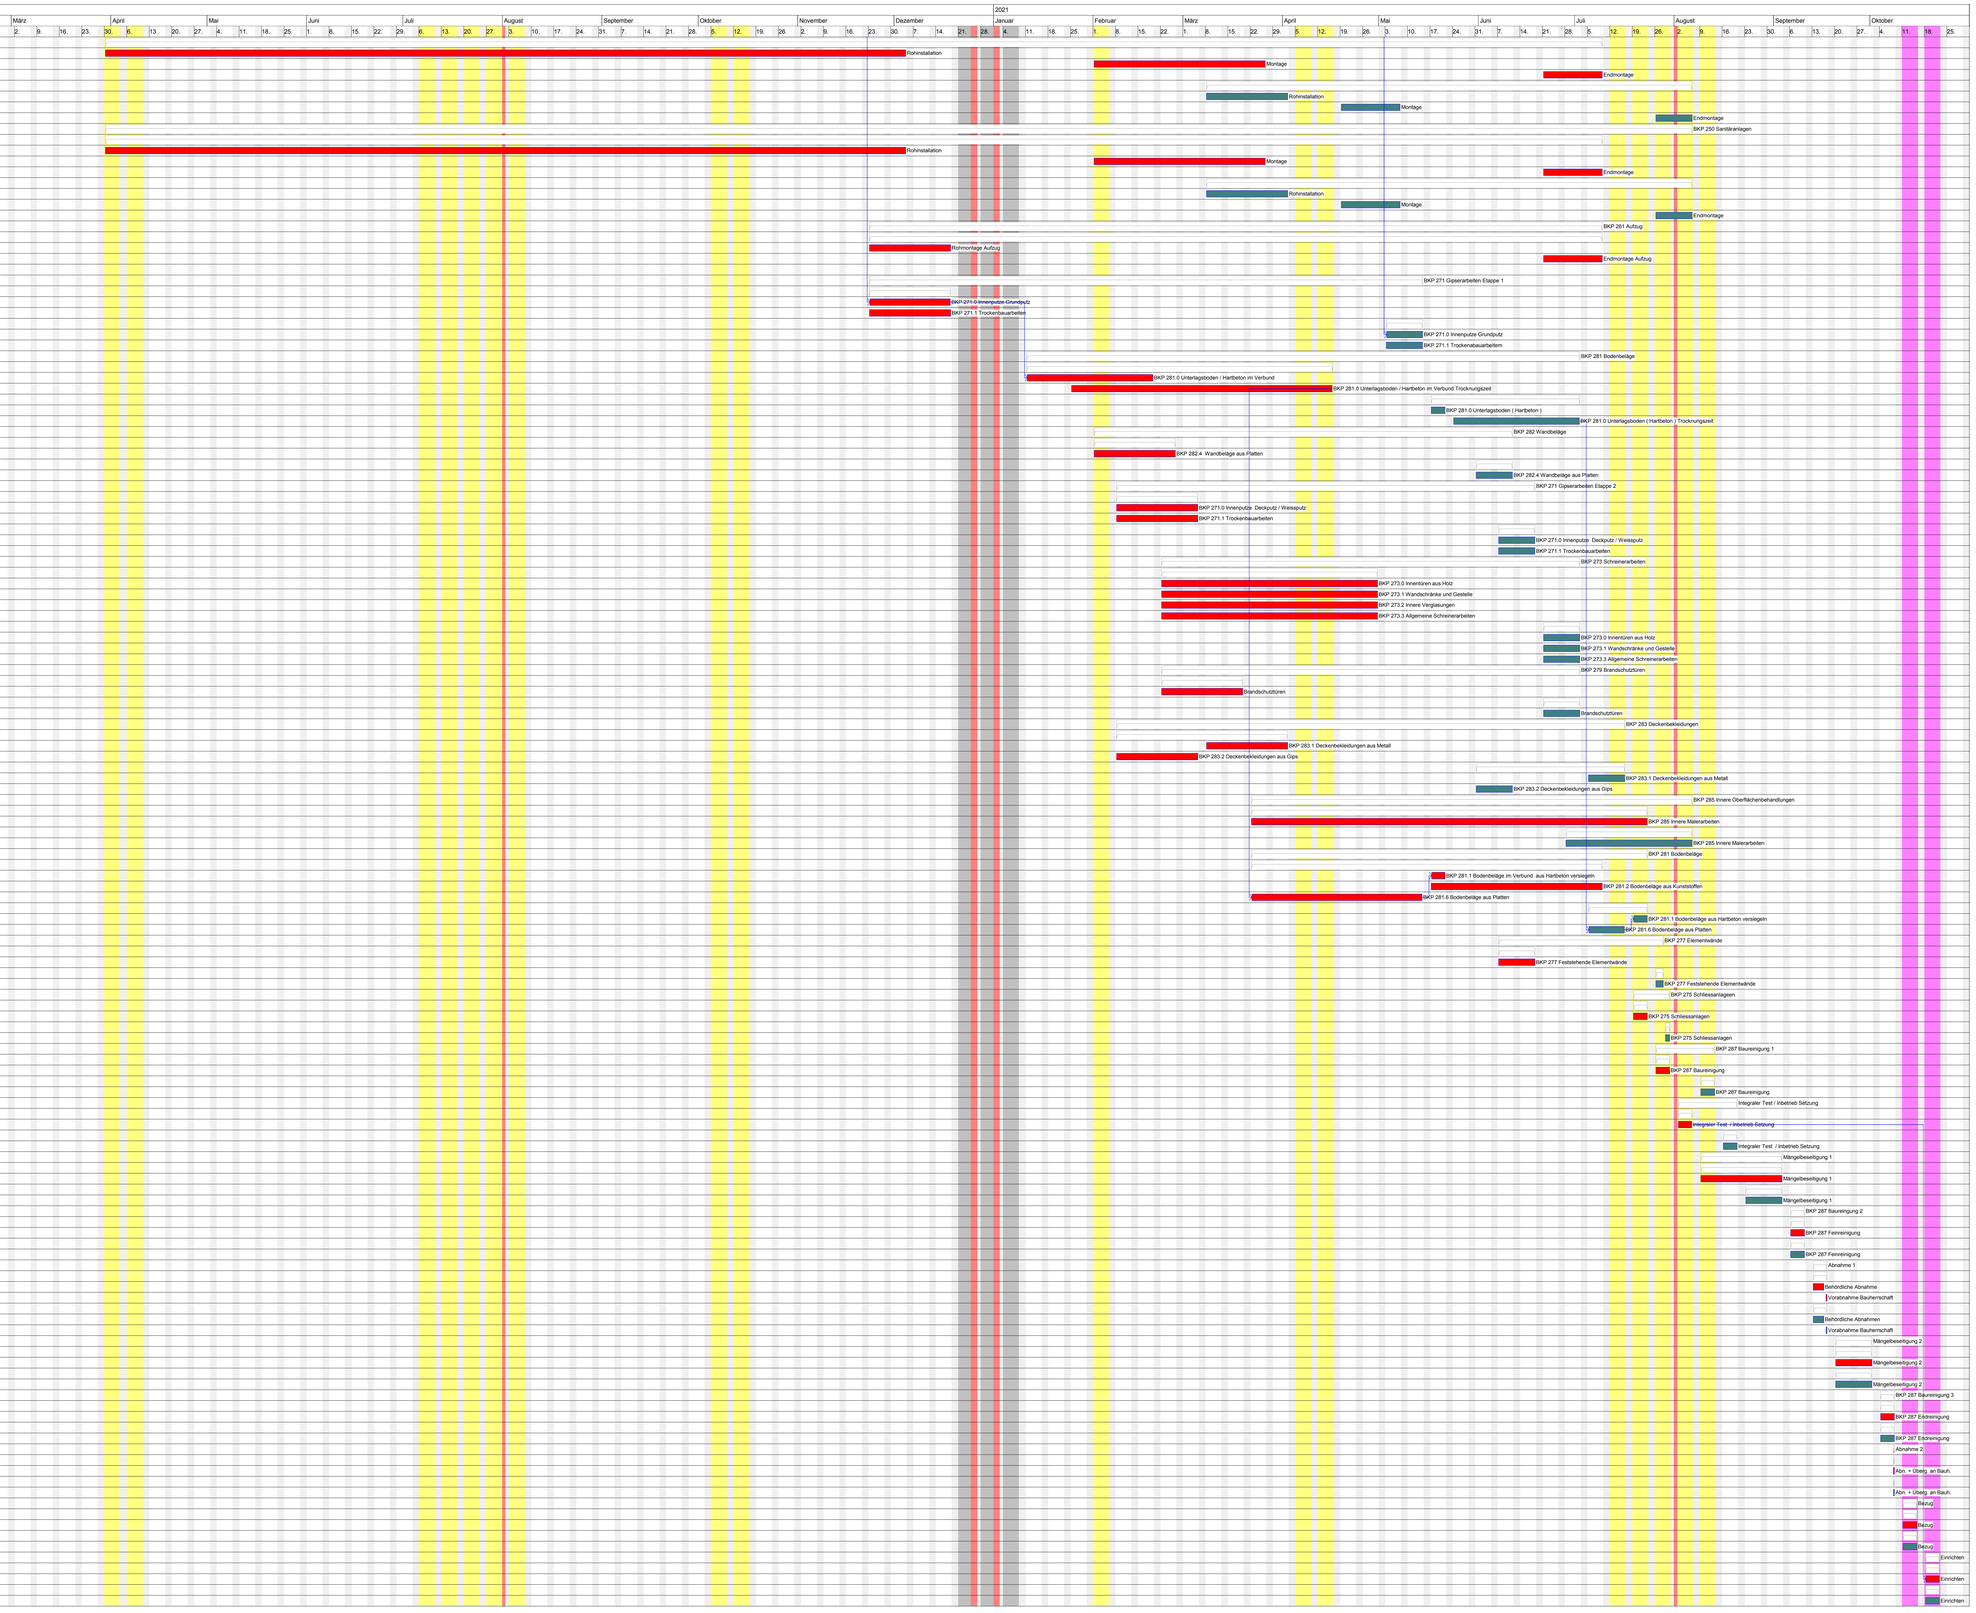
| | BKP | Bezeichnung | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | OGL | Bezeichnung | | | |
| | | Unternehmer | Start | Ende | D |
| 154 | B2 | | 30.03.20 | 09.07.21 | 333 |
| 155 | | *Rohrinstallation* | 30.03.20 | 04.12.20 | 180 |
| 156 | | *Montage* | 01.02.21 | 26.03.21 | 40 |
| 157 | | *Endmontage* | 21.06.21 | 09.07.21 | 15 |
| 158 | TH | | 08.03.21 | 06.08.21 | 110 |
| 159 | | *Rohrinstallation* | 08.03.21 | 02.04.21 | 20 |
| 160 | | *Montage* | 19.04.21 | 07.05.21 | 15 |
| 161 | | *Endmontage* | 26.07.21 | 06.08.21 | 10 |
| 162 | | **BKP 250 Sanitäranlagen** | 30.03.20 | 06.08.21 | **353** |
| 163 | B2 | | 30.03.20 | 09.07.21 | 333 |
| 164 | | *Rohrinstallation* | 30.03.20 | 04.12.20 | 180 |
| 165 | | *Montage* | 01.02.21 | 26.03.21 | 40 |
| 166 | | *Endmontage* | 21.06.21 | 09.07.21 | 15 |
| 167 | TH | | 08.03.21 | 06.08.21 | 110 |
| 168 | | *Rohrinstallation* | 08.03.21 | 02.04.21 | 20 |
| 169 | | *Montage* | 19.04.21 | 07.05.21 | 15 |
| 170 | | *Endmontage* | 26.07.21 | 06.08.21 | 10 |
| 171 | | **BKP 261 Aufzug** | 23.11.20 | 09.07.21 | **163** |
| 172 | B2 | | 23.11.20 | 09.07.21 | 163 |
| 173 | | *Rohmontage Aufzug* | 23.11.20 | 18.12.20 | 20 |
| 174 | | *Endmontage Aufzug* | 21.06.21 | 09.07.21 | 15 |
| 175 | TH | | | | |
| 176 | | **BKP 271 Gipserarbeiten Etappe 1** | 23.11.20 | 14.05.21 | **123** |
| 177 | B2 | | 23.11.20 | 18.12.20 | 20 |
| 178 | | *BKP 271.0 Innenputze Grundputz* | 23.11.20 | 18.12.20 | 20 |
| 179 | | *BKP 271.1 Trockenbauarbeiten* | 23.11.20 | 18.12.20 | 20 |
| 180 | TH | | 03.05.21 | 14.05.21 | 10 |
| 181 | | *BKP 271.0 Innenputze Grundputz* | 03.05.21 | 14.05.21 | 10 |
| 182 | | *BKP 271.1 Trockenabauarbeitem* | 03.05.21 | 14.05.21 | 10 |
| 183 | | **BKP 281 Bodenbeläge** | 11.01.21 | 02.07.21 | **125** |
| 184 | B2 | | 11.01.21 | 16.04.21 | 70 |
| 185 | | *BKP 281.0 Unterlagsboden / Hartbeton im Verbund* | 11.01.21 | 19.02.21 | 30 |
| 186 | | *BKP 281.0 Unterlagsboden / Hartbeton im Verbund T* | 25.01.21 | 16.04.21 | 60 |
| 187 | TH | | 17.05.21 | 02.07.21 | 35 |
| 188 | | *BKP 281.0 Unterlagsboden ( Hartbeton )* | 17.05.21 | 21.05.21 | 5 |
| 189 | | *BKP 281.0 Unterlagsboden ( Hartbeton ) Trocknungs* | 24.05.21 | 02.07.21 | 30 |
| 190 | | **BKP 282 Wandbeläge** | 01.02.21 | 11.06.21 | **95** |
| 191 | B2 | | 01.02.21 | 26.02.21 | 20 |
| 192 | | *BKP 282.4 Wandbeläge aus Platten* | 01.02.21 | 26.02.21 | 20 |
| 193 | TH | | 31.05.21 | 11.06.21 | 10 |
| 194 | | *BKP 282.4 Wandbeläge aus Platten* | 31.05.21 | 11.06.21 | 10 |
| 195 | | **BKP 271 Gipserarbeiten Etappe 2** | 08.02.21 | 18.06.21 | **95** |
| 196 | B2 | | 08.02.21 | 05.03.21 | 20 |
| 197 | | *BKP 271.0 Innenputze Deckputz / Weissputz* | 08.02.21 | 05.03.21 | 20 |
| 198 | | *BKP 271.1 Trockenbauarbeiten* | 08.02.21 | 05.03.21 | 20 |
| 199 | TH | | 07.06.21 | 18.06.21 | 10 |
| 200 | | *BKP 271.0 Innenputze Deckputz / Weissputz* | 07.06.21 | 18.06.21 | 10 |
| 201 | | *BKP 271.1 Trockenbauarbeiten* | 07.06.21 | 18.06.21 | 10 |
| 202 | | **BKP 273 Schreinerarbeiten** | 22.02.21 | 02.07.21 | **95** |
| 203 | B2 | | 22.02.21 | 30.04.21 | 50 |
| 204 | | *BKP 273.0 Innentüren aus Holz* | 22.02.21 | 30.04.21 | 50 |
| 205 | | *BKP 273.1 Wandschränke und Gestelle* | 22.02.21 | 30.04.21 | 50 |
| 206 | | *BKP 273.2 Innere Verglasungen* | 22.02.21 | 30.04.21 | 50 |
| 207 | | *BKP 273.3 Allgemeine Schreinerarbeiten* | 22.02.21 | 30.04.21 | 50 |
| 208 | TH | | 21.06.21 | 02.07.21 | 10 |
| 209 | | *BKP 273.0 Innentüren aus Holz* | 21.06.21 | 02.07.21 | 10 |
| 210 | | *BKP 273.1 Wandschränke und Gestelle* | 21.06.21 | 02.07.21 | 10 |
| 211 | | *BKP 273.3 Allgemeine Schreinerarbeiten* | 21.06.21 | 02.07.21 | 10 |
| 212 | | **BKP 279 Brandschutztüren** | 22.02.21 | 02.07.21 | **95** |
| 213 | B2 | | 22.02.21 | 19.03.21 | 20 |
| 214 | | *Brandschutztüren* | 22.02.21 | 19.03.21 | 20 |
| 215 | TH | | 21.06.21 | 02.07.21 | 10 |
| 216 | | *Brandschutztüren* | 21.06.21 | 02.07.21 | 10 |
| 217 | | **BKP 283 Deckenbekleidungen** | 08.02.21 | 16.07.21 | **115** |
| 218 | B2 | | 08.02.21 | 02.04.21 | 40 |
| 219 | | *BKP 283.1 Deckenbekleidungen aus Metall* | 08.03.21 | 02.04.21 | 20 |
| 220 | | *BKP 283.2 Deckenbekleidungen aus Gips* | 08.02.21 | 05.03.21 | 20 |
| 221 | TH | | 31.05.21 | 16.07.21 | 35 |
| 222 | | *BKP 283.1 Deckenbekleidungen aus Metall* | 05.07.21 | 16.07.21 | 10 |
| 223 | | *BKP 283.2 Deckenbekleidungen aus Gips* | 31.05.21 | 11.06.21 | 10 |
| 224 | | **BKP 285 Innere Oberflächenbehandlungen** | 22.03.21 | 06.08.21 | **100** |
| 225 | B2 | | 22.03.21 | 23.07.21 | 90 |
| 226 | | *BKP 285 Innere Malerarbeiten* | 22.03.21 | 23.07.21 | 90 |
| 227 | TH | | 28.06.21 | 06.08.21 | 30 |
| 228 | | *BKP 285 Innere Malerarbeiten* | 28.06.21 | 06.08.21 | 30 |
| 229 | | **BKP 281 Bodenbeläge** | 22.03.21 | 23.07.21 | **90** |
| 230 | B2 | | 22.03.21 | 09.07.21 | 80 |
| 231 | | *BKP 281.1 Bodenbeläge im Verbund aus Hartbeton* | 17.05.21 | 21.05.21 | 5 |
| 232 | | *BKP 281.2 Bodenbeläge aus Kunststoffen* | 17.05.21 | 09.07.21 | 40 |
| 233 | | *BKP 281.6 Bodenbeläge aus Platten* | 22.03.21 | 14.05.21 | 40 |
| 234 | TH | | 05.07.21 | 23.07.21 | 15 |
| 235 | | *BKP 281.1 Bodenbeläge aus Hartbeton versiegeln* | 19.07.21 | 23.07.21 | 5 |
| 236 | | *BKP 281.6 Bodenbeläge aus Platten* | 05.07.21 | 16.07.21 | 10 |
| 237 | | **BKP 277 Elementwände** | 07.06.21 | 28.07.21 | **38** |
| 238 | B2 | | 07.06.21 | 18.06.21 | 10 |
| 239 | | *BKP 277 Feststehende Elementwände* | 07.06.21 | 18.06.21 | 10 |
| 240 | TH | | 26.07.21 | 28.07.21 | 3 |
| 241 | | *BKP 277 Feststehende Elementwände* | 26.07.21 | 28.07.21 | 3 |
| 242 | | **BKP 275 Schliessanlageen** | 19.07.21 | 30.07.21 | **10** |
| 243 | B2 | | 19.07.21 | 23.07.21 | 5 |
| 244 | | *BKP 275 Schliessanlagen* | 19.07.21 | 23.07.21 | 5 |
| 245 | TH | | 29.07.21 | 30.07.21 | 2 |
| 246 | | *BKP 275 Schliessanlagen* | 29.07.21 | 30.07.21 | 2 |
| 247 | | **BKP 287 Baureinigung 1** | 26.07.21 | 13.08.21 | **15** |
| 248 | B2 | | 26.07.21 | 30.07.21 | 5 |
| 249 | | *BKP 287 Baureinigung* | 26.07.21 | 30.07.21 | 5 |
| 250 | TH | | 09.08.21 | 13.08.21 | 5 |
| 251 | | *BKP 287 Baureinigung* | 09.08.21 | 13.08.21 | 5 |
| 252 | | **Integraler Test / Inbetrieb Setzung** | 02.08.21 | 20.08.21 | **15** |
| 253 | B2 | | 02.08.21 | 06.08.21 | 5 |
| 254 | | *Integraler Test / Inbetrieb Setzung* | 02.08.21 | 06.08.21 | 5 |
| 255 | TH | | 16.08.21 | 20.08.21 | 5 |
| 256 | | *Integraler Test / Inbetrieb Setzung* | 16.08.21 | 20.08.21 | 5 |
| 257 | | **Mängelbeseitigung 1** | 09.08.21 | 03.09.21 | **20** |
| 258 | B2 | | 09.08.21 | 03.09.21 | 20 |
| 259 | | *Mängelbeseitigung 1* | 09.08.21 | 03.09.21 | 20 |
| 260 | TH | | 23.08.21 | 03.09.21 | 10 |
| 261 | | *Mängelbeseitigung 1* | 23.08.21 | 03.09.21 | 10 |
| 262 | | **BKP 287 Baureinigung 2** | 06.09.21 | 10.09.21 | **5** |
| 263 | B2 | | 06.09.21 | 10.09.21 | 5 |
| 264 | | *BKP 287 Feinreinigung* | 06.09.21 | 10.09.21 | 5 |
| 265 | TH | | 06.09.21 | 10.09.21 | 5 |
| 266 | | *BKP 287 Feinreinigung* | 06.09.21 | 10.09.21 | 5 |
| 267 | | **Abnahme 1** | 13.09.21 | 17.09.21 | **5** |
| 268 | B2 | | 13.09.21 | 17.09.21 | 5 |
| 269 | | *Behördliche Abnahme* | 13.09.21 | 16.09.21 | 4 |
| 270 | | *Vorabnahme Bauherrschaft* | 17.09.21 | 17.09.21 | 1 |
| 271 | TH | | 13.09.21 | 17.09.21 | 5 |
| 272 | | *Behördliche Abnahmen* | 13.09.21 | 16.09.21 | 4 |
| 273 | | *Vorabnahme Bauherrschaft* | 17.09.21 | 17.09.21 | 1 |
| 274 | | **Mängelbeseitigung 2** | 20.09.21 | 01.10.21 | **10** |
| 275 | B2 | | 20.09.21 | 01.10.21 | 10 |
| 276 | | *Mängelbeseitigung 2* | 20.09.21 | 01.10.21 | 10 |
| 277 | TH | | 20.09.21 | 01.10.21 | 10 |
| 278 | | *Mängelbeseitigung 2* | 20.09.21 | 01.10.21 | 10 |
| 279 | | **BKP 287 Baureinigung 3** | 04.10.21 | 08.10.21 | **5** |
| 280 | B2 | | 04.10.21 | 08.10.21 | 5 |
| 281 | | *BKP 287 Endreinigung* | 04.10.21 | 08.10.21 | 5 |
| 282 | TH | | 04.10.21 | 08.10.21 | 5 |
| 283 | | *BKP 287 Endreinigung* | 04.10.21 | 08.10.21 | 5 |
| 284 | | **Abnahme 2** | 08.10.21 | 08.10.21 | **1** |
| 285 | B2 | | 08.10.21 | 08.10.21 | 1 |
| 286 | | *Abn. + Überg. an Bauh.* | 08.10.21 | 08.10.21 | 1 |
| 287 | TH | | 08.10.21 | 08.10.21 | 1 |
| 288 | | *Abn. + Überg. an Bauh.* | 08.10.21 | 08.10.21 | 1 |
| 289 | | **Bezug** | 11.10.21 | 15.10.21 | **5** |
| 290 | B2 | | 11.10.21 | 15.10.21 | 5 |
| 291 | | *Bezug* | 11.10.21 | 15.10.21 | 5 |
| 292 | TH | | 11.10.21 | 15.10.21 | 5 |
| 293 | | *Bezug* | 11.10.21 | 15.10.21 | 5 |
| 294 | | **Einrichten** | 18.10.21 | 22.10.21 | **5** |
| 295 | B2 | | 18.10.21 | 22.10.21 | 5 |
| 296 | | *Einrichten* | 18.10.21 | 22.10.21 | 5 |
| 297 | TH | | 18.10.21 | 22.10.21 | 5 |
| 298 | | *Einrichten* | 18.10.21 | 22.10.21 | 5 |
